


RV. 555 SOTRASAMBANDET – Drotningstvik

Januar 2024

Tidslinje for arbeidet med Sotrasambandet framover (se bakside for detaljer).

Hvor	Hva	Planlagt start	Antatt ferdig
A	Sprenging dagsone (ikke tunnel) stort volum	Pågående	Februar 2024
B, C, D	Tunneldriving og sprengning	Pågående	August 2024
Ax 5 – 8 Brotårn	Betongarbeid	Februar 2024	Juni 2025
Ax 5 – 8 Brodekk	Betong- og stålarbeid	April 2024	Desember 2026

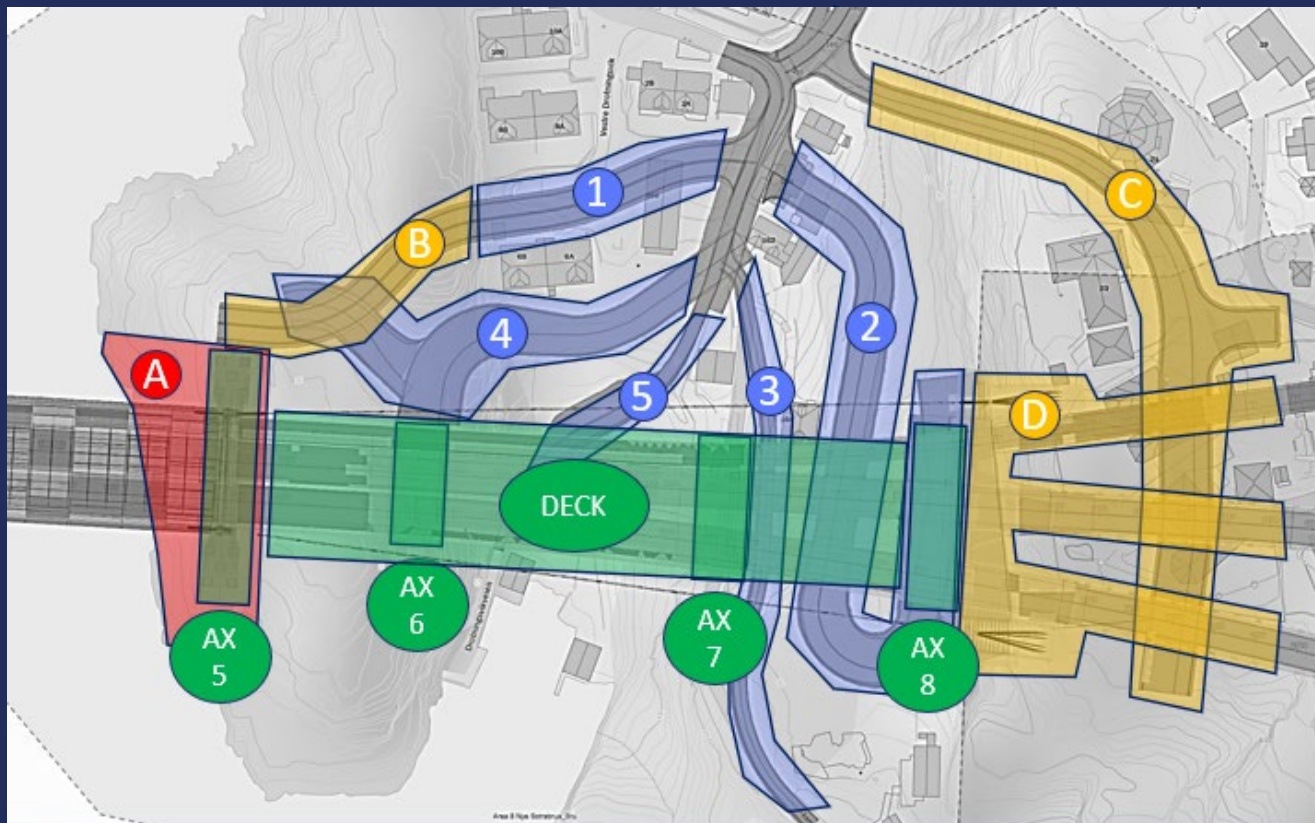

Vi bygger Sotrasambandet

- Statens vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Sotra Link for å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde
- Sotra Link har totalansvaret for drift av veganlegget i 25 år
- Byggestart 1. kvartal 2023
- Byggetid 5 år



Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev



Meld deg på sprengningsvarsel (SMS)



Besøk oss på www.sotralink.no



Besøk Statens vegvesen på www.vegvesen.no



www.sotralink.no

Alle datoer er planlagte, med forbehold om endringer!

Måter å bedre støv/støy- og trafikkforhold for naboer

Hvor	Hva	Status	Planlagt start	Planlagt utført	Aktivitet	Støy
3	Gangvei	Pågående	September 2023	Februar 2024	Sprengning, gravearbeid	Mye støy-boring/hammer dagsone (ute)
A	Sprengning	Pågående	August 2023	Februar 2024	Boring og sprengning	Mye støy-boring/hammer dagsone (ute)
C	Forankringstunnel	Pågående	November 2023	Mai 2024	Boring og sprengning	Mye støy- boring tunnel
D	Hovedtunnel (Drotningsvikstunnelen)	Ikke startet	Januar 2024	August 2024	Boring og sprengning	Mye støy, sprengning, boring dagsone.
Ax 5	Brotårn – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	Februar 2024	June 2025	Betongarbeid, tårnkran	Støy – armeringsjern, forskaling, betong, tårnkran; i perioder mye støy (ved bøing av stål)
Ax 6	Viadukt – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	Mars 2024	Juni 2024	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 7	Viadukt – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	April 2024	August 2024	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 8	Brofeste Viadukt – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	August 2024	Oktober 2024	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 8- Ax 7	Brodekk Fase 4 – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	Oktober 2024	Januar 2025	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 7- Ax 6	Brodekk Fase 5 – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	Desember 2024	Mars 2025	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 6- Ax 5	Brodekk Fase 6 – Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	Januar 2025	Juni 2025	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong
Ax 8	Portal for ankerfeste - Konstruksjonsarbeid	Ikke startet	April 2024	Desember 2026	Betongarbeid	Støy – armeringsjern, forskaling, betong

Avbøtende tiltak utført:

- Installert støymonitorer i de mest utsatte husene, og analyserer støynivå fortløpende.
- Støyende utstyr som skal stå fast, er plassert bort fra utsatte hus. I tillegg er fysiske barrierer (telt) plassert mellom støykilder og utsatte hus.
- Ved boring bruker vi vann (der det er mulig) for å begrense støv.
- Tryggere fotgjengeradkomst (fortau langs ØV Vestre Drotningsvik).
- Støypanelvegger installert langs området for å redusere støv til området.
- Forlenget traseen til kostebilen, går daglig langs Vestre Drotningsvik for å fjerne støv eller gjørme (05.01.2024).
- Montert konkave speil ved hjørnene med redusert sikt (05.01.2024).
- *Ingen pigging* på søndager (fra 14.01.2024) Øvrige aktiviteter ved LNS tunnellag, inkludert boring og sprengning, fortsetter annenhver søndag, med første arbeidssøndag 21.01.2024, mellom kl 07:00 og 19:00.

Løsninger vurdert, men ikke mulig å implementere:

- Heve høyden på støypanelveggene pga. fare for velt.

KONTAKT:

Nabokontakt: 412 95 160 (mellom kl. 09 – 15)
E-post: Sotrasambandet@sotralink.no

Følg oss på:
www.facebook.com/sotrasambandet
www.instagram.com/sotrasambandet
LinkedIn (sotra Link).



www.sotralink.no

Takk for din tålmodighet i byggeperioden!
